
Ветрозащита: чек-лист

Общие правила (для пола, стен и крыши)

- [ ] Нахлёст везде не меньше **15 см**, верхнее полотно поверх нижнего (снизу вверх).
- [ ] Все нахлёсты проклеены лентой, даже если на полотне есть самоклеящаяся полоса; перед проклейкой нет пыли, опилок, мусора; лента одинаково захватывает оба полотна.
- [ ] Стыки полотен только на каркасе.
- [ ] Скобы **14 мм** в каждую стойку, шаг **30 см**.
- [ ] Лицевая сторона с надписями смотрит на улицу, на полу тоже.


Нахлёст, стык на стойке, скобы

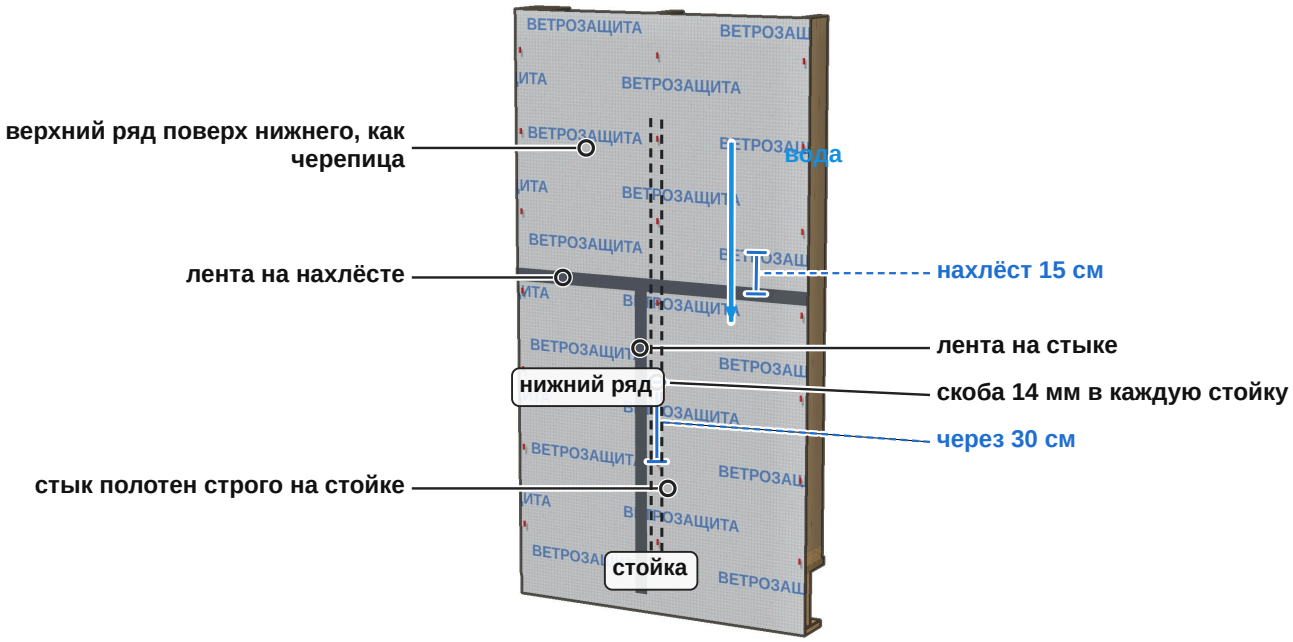

1 Пол

- [ ] Мембрана выпущена за наружный край обвязки на **30 см** по всему периметру.

Пол

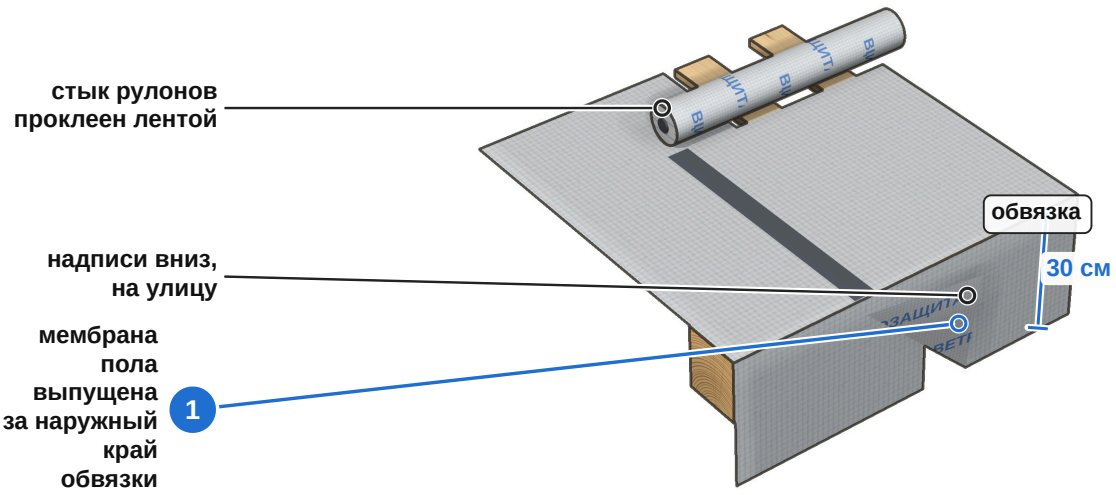

2 Низ стены

- [ ] Свисающий край мембраны пола заведён под мембрану стены.

Проверил: _____ Дата: _____

3 Стены

- [ ] Рулон раскатан только горизонтально.
- [ ] Мембрана доведена до самого верха стены.


4 Верх стены и фронтон

- [ ] Карниз: кровельная мембрана кончается на капельнике; с мембраной стены не склеена; щель **15 мм** под подшивкой открыта.
- [ ] Фронтон: мембрана стены доведена до самой крыши; кровельная лежит сверху на мембране фронтона.


5 Окна и двери

- [ ] Мембрана в проёме разрезана крест-накрест от угла к углу, лепестки завёрнуты внутрь на всю толщину стойки.


Стены

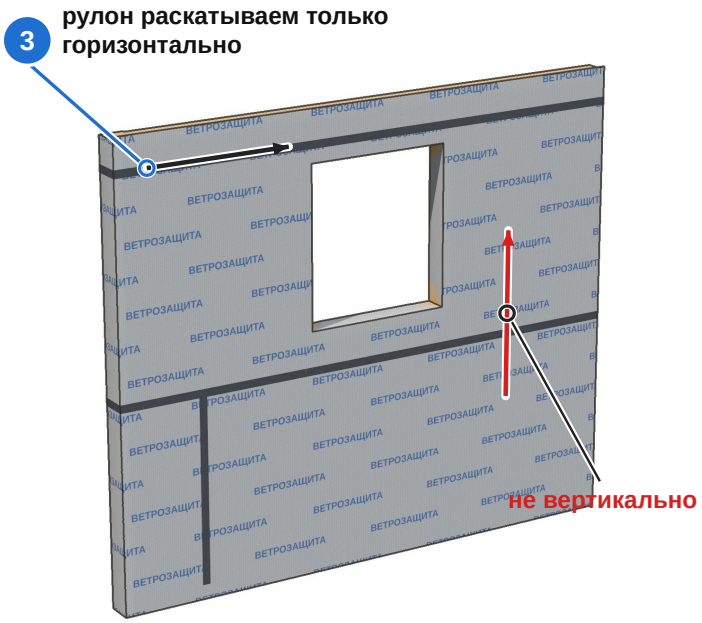


Карниз

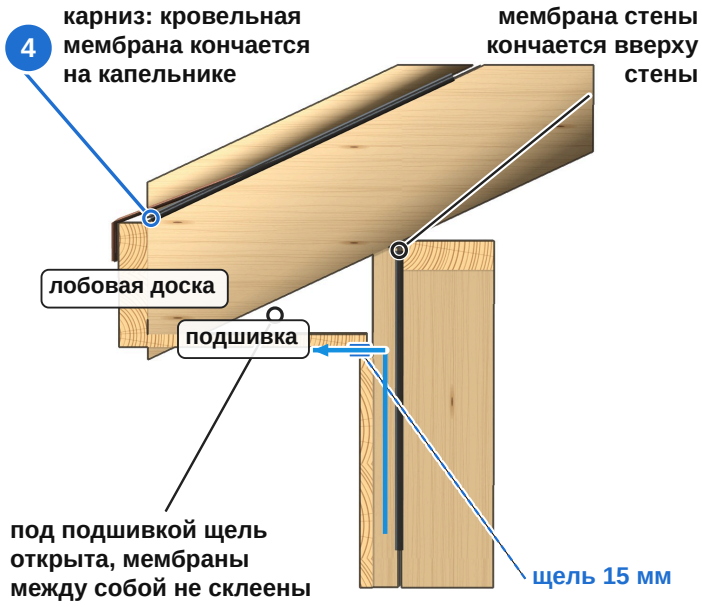

Фронтон

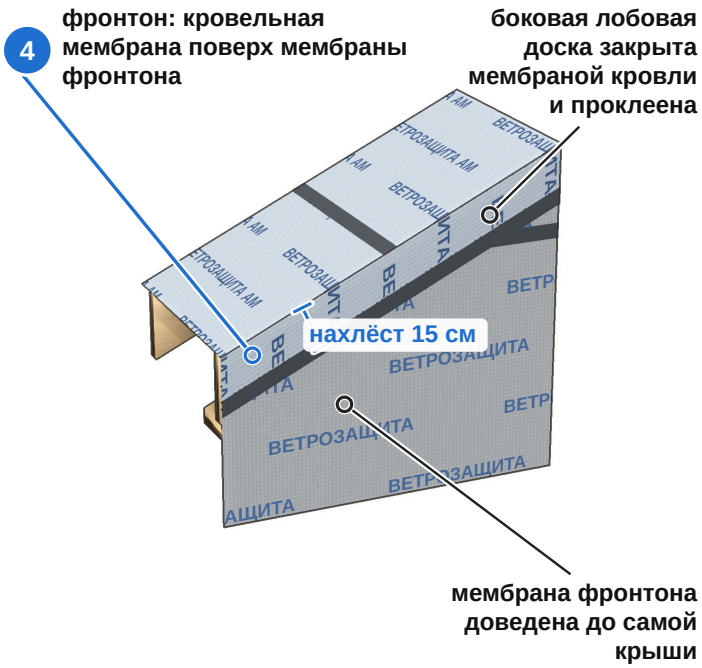

Окно

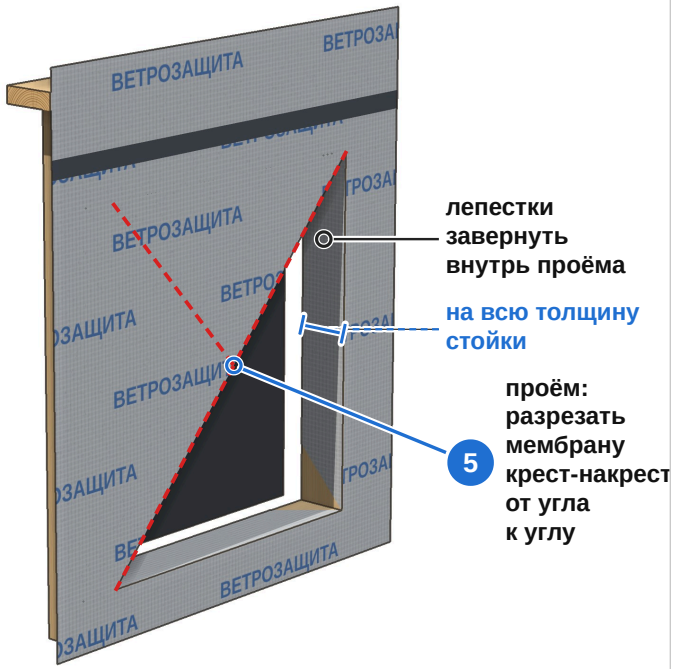


Проверил: _____ Дата: _____


6 Трубы и разрывы

- [ ] Крест в мембране меньше трубы, лепестки прижаты к трубе и обмотаны лентой без незаклеенных мест.
- [ ] Любой разрез или дыра закрыты заплатой на **10 см** больше с каждой стороны.

Труба

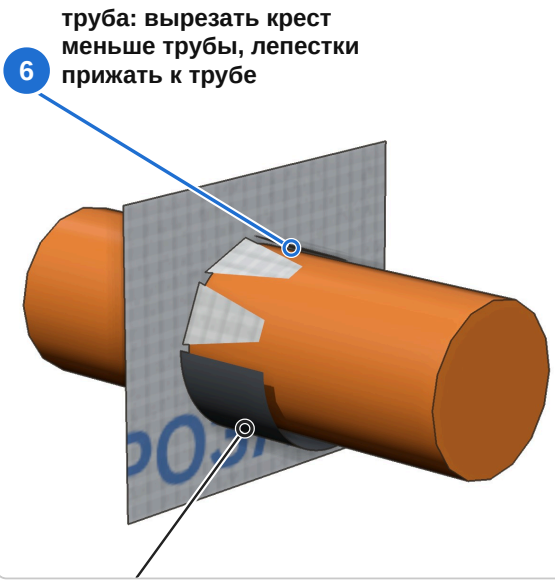


Заплата

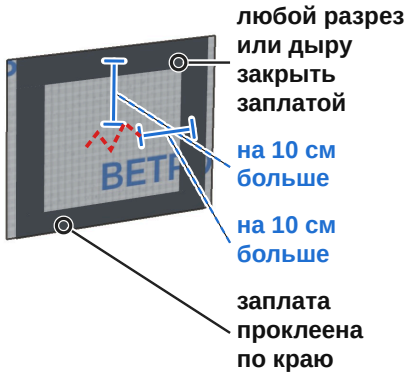

7 Контррешётка

- [ ] Бруски **40×40** на каждой стойке поверх мембраны (вентзазор **4 см**).
- [ ] Гвозди **90 мм** через **30 см**, первый в **5 см** от конца бруска.
- [ ] Поставлена в тот же день, что и мембрана.

Контррешётка

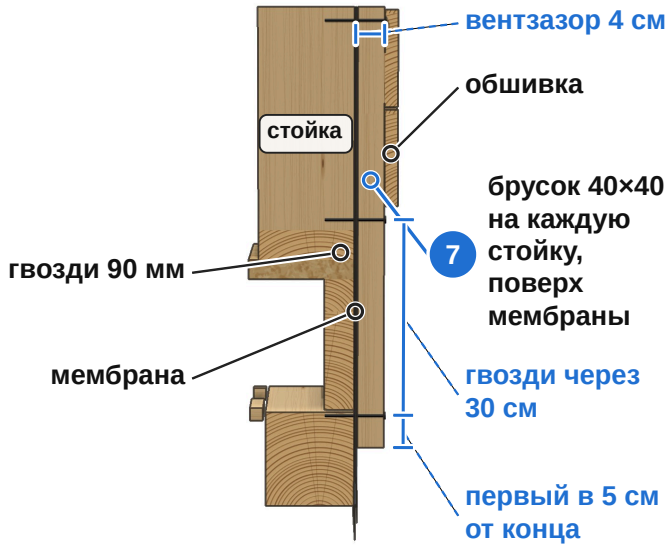


Проверил: _____ Дата: _____


8 Кровля

- [ ] Кровельная мембрана с маркировкой АМ; стеновая на кровле не лежит.
- [ ] Рулоны раскатаны поперёк каркаса от карниза вверх.
- [ ] Боковая лобовая доска закрыта кровельной мембраной и проклеена.
- [ ] Под брусками на мембране демпферная лента.
- [ ] Конёк: мембрана не разрезана, перекинута на другой скат не менее **30 см**.
- [ ] Нет запаса **30 см**: сверху на конёк целая лента, свисает по обе стороны одинаково, проклеена.


Кровля

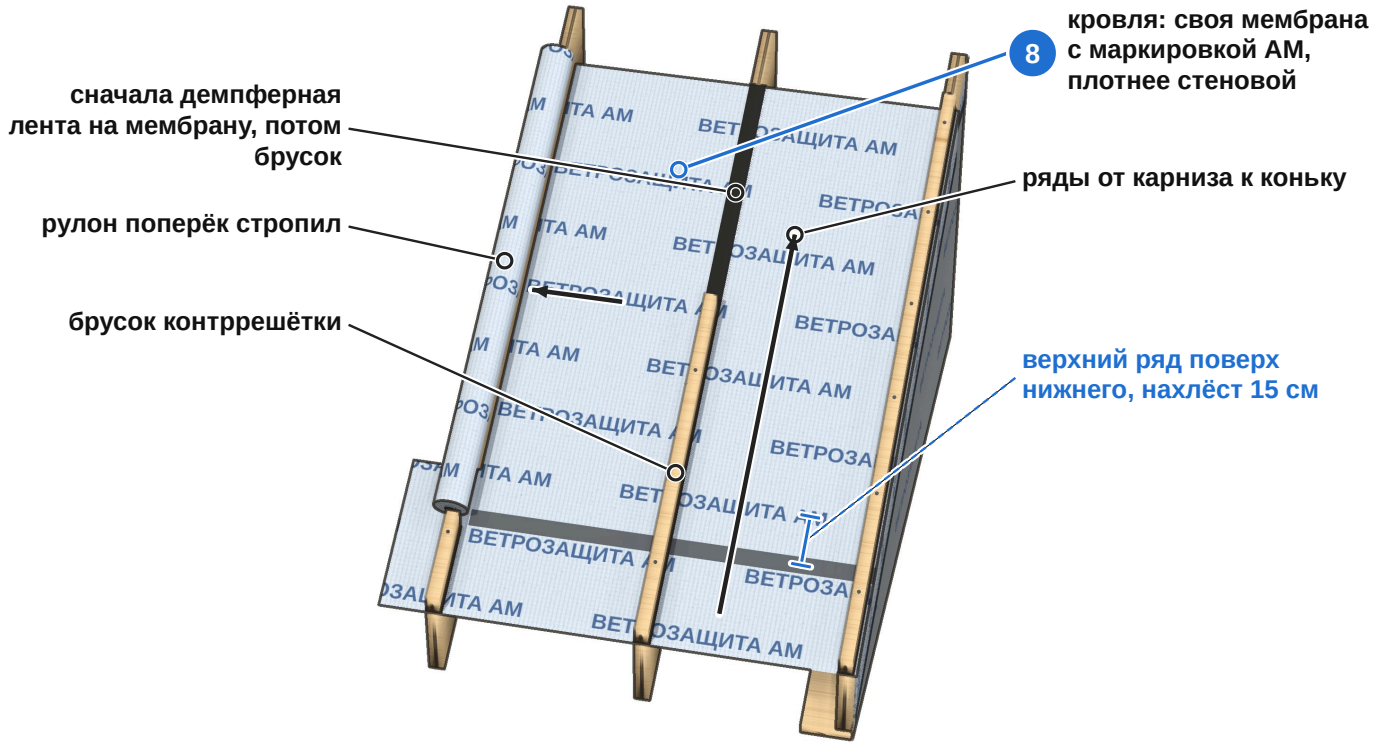

Конёк: перекинуть

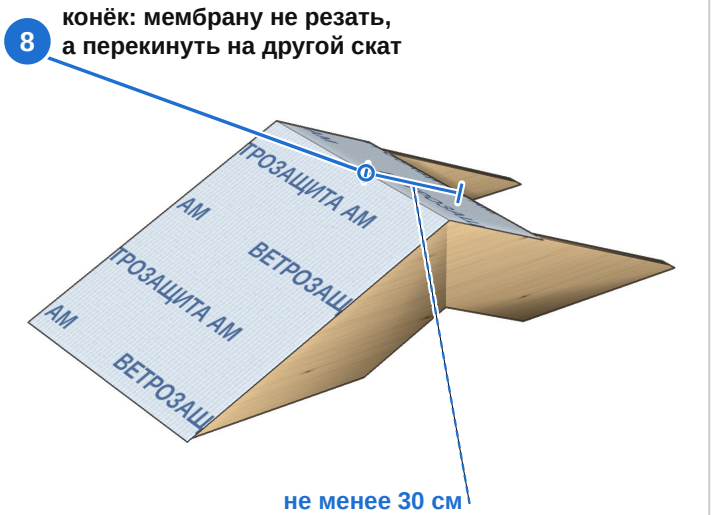

Конёк: целая лента

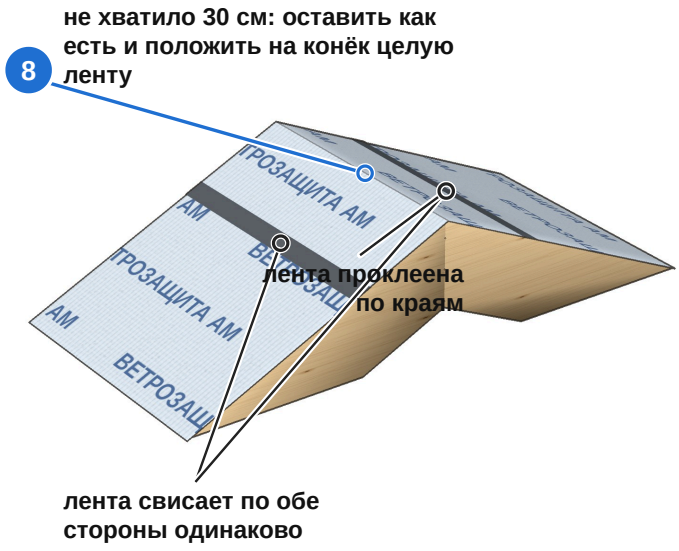

Проверил: _____ Дата: _____
